


# **PLAN DE ACABADO**

## **Urbanización de Eurovillas**

# RENOVACION RED ABASTECIMIENTO

## PROCENTAJE EJECUTADO *estimado* (%)

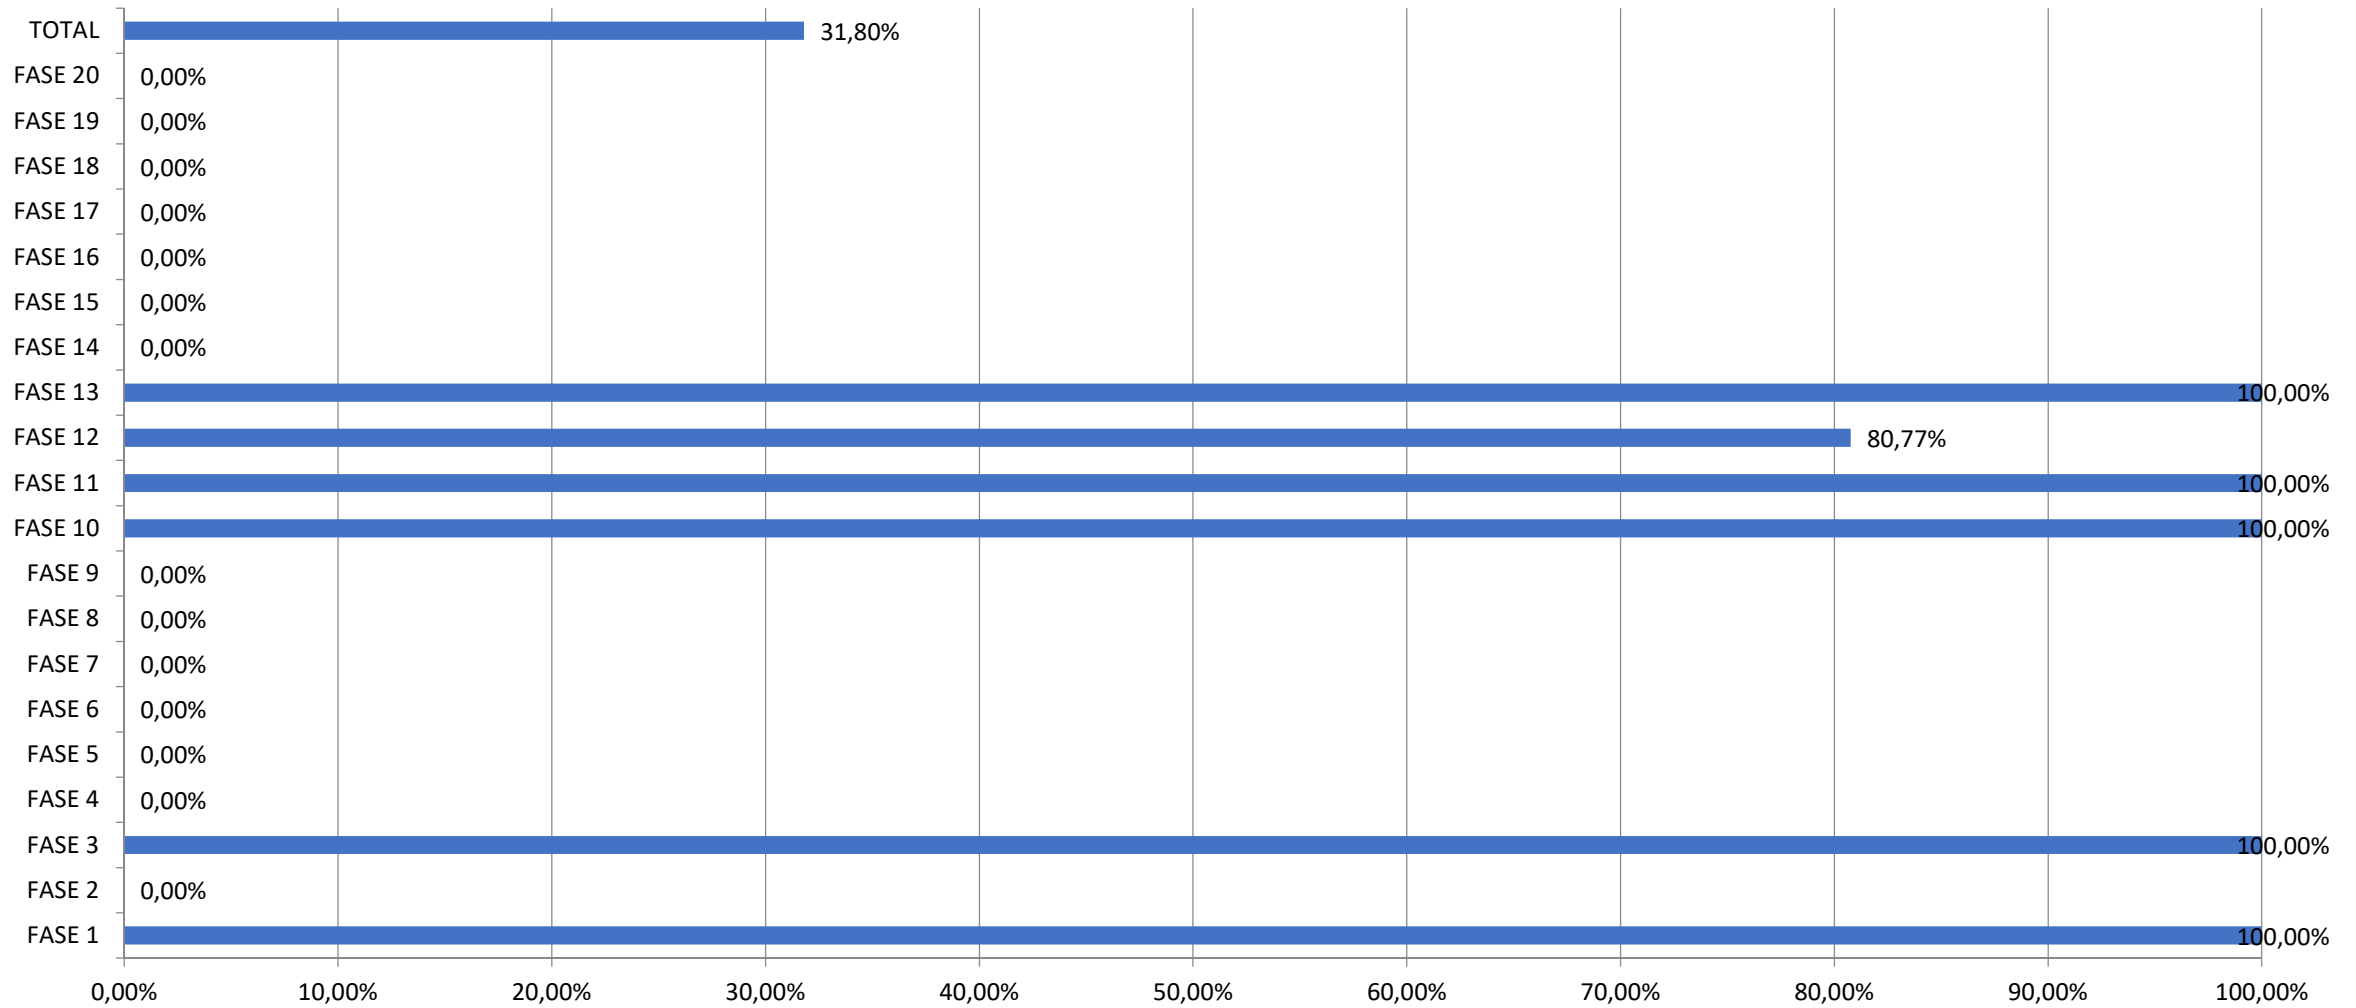

Fuente: PROPIA. Datos estimados

OBRAS RENOVACION CANALIZACION DEL AGUA EN EUROVILLAS

FASE	PRESENTAC PROPUESTA	APERTURA PROPOSIC	ADJUDICAC DEFINITIVA	PUBLICAC BOCM	FORMALIZAC CONTRATO	INICIO OBRAS	DURACION	FIN OBRAS	VALOR ESTIMADO (sin IVA)	IMPORTE ADJUDICACION	% REDUCCION	ADJUDICATARIO INICIAL precio inferior	ADJUDICATARIO DEFINITIVO	% EJECUTADO Estimado	
1	16/03/2018	06/04/2018	04/09/2018	04/12/2018	16/11/2018	01/06/2019	180	28/11/2019	1.328.362	560.000	57,84%	TADOP	ULLASTRES	100,00%	
2															
3	16/03/2018	06/04/2018	31/07/2018	08/10/2018	21/09/2018	22/10/2018	240	19/06/2019	1.619.965	697.395	56,95%	TRAZANSA	ACSA, OBRAS E INF	100,00%	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10	02/04/2018	20/04/2018	04/09/2018	14/11/2018	18/10/2018	03/06/2019	180	30/11/2019	1.129.435	481.704	57,35%	UTE SAGLAS	ACSA, OBRAS E INF	100,00%	
11	02/04/2018	20/04/2018	10/09/2018	19/11/2018	16/10/2018	08/02/2019	210	06/09/2019	1.226.074	523.300	57,32%	TRAZANSA	COBRA	100,00%	
12	26/03/2018	13/04/2018	28/09/2018	10/12/2018	21/11/2018	25/07/2019	240	21/03/2020	1.398.022	602.230	56,92%	TRAZANSA	FCC AQUALIA	80,77%	
13	26/03/2018	13/04/2018	04/09/2018	29/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	240	02/07/2019	1.365.581	585.800	57,10%	LICUAS	FCC AQUALIA	100,00%	
14	01/07/2019	12/07/2019	<b>¿PARALIZADA LICITACION?</b>					225	12/08/1900	1.044.567	510.848	51,09%	MESTOLAYA	Pte adjudicación	
15	12/07/2019	26/07/2019						225	12/08/1900	1.030.043	508.326	50,65%	ELECNOR	Pte adjudicación	
16	01/07/2019	12/07/2019						210	28/07/1900	798.760	397.743	50,20%	MESTOLAYA	Pte adjudicación	
17	08/07/2019	19/07/2019						315	10/11/1900	1.739.414	844.502	51,45%	MESTOLAYA	Pte adjudicación	
18															
19															
20	11/02/2019	12/04/2019	<i>(aplazada de forma INDEFINIDA)</i>					240	27/08/1900						
<b>TOTAL EN FASE DE LICITACION Y/O ADJUDICADO</b>									12.680.223	5.711.848	54,95%	Reducción promedio adjudicado		31,80%	

PREVISION REPARTO COSTES (INICIAL) Parcela tipo 1.000 m2		
	Sin IVA	Con IVA
PRESUPUESTO TOTAL PREVISTO INICIALMENTE	25.550.799,22 €	30.916.467,06 €
PREVISION DE PROPUESTA A LA BAJA	40%	15.330.479,53 €
		18.549.880,23 €

COEFICIENTE PARTICIPACIÓN	0,025291035
CUOTA MES	16,83
CUOTA BIMESTRAL	33,66
DURACION	20 AÑOS

REPARTO COSTES DEEFINITIVO Parcela tipo 1.000 m2 (*)		
	Sin IVA	con IVA
COSTE TOTAL DEFINITIVO		

COEFICIENTE PARTICIPACIÓN	0,025291035
CUOTA MES	
CUOTA BIMESTRAL	0
DURACION	20 AÑOS

(\*) Cuando se conozcan el resultado definitivo de los concursos públicos

FUENTE: BOCM y Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
